


LAMPIRAN

Lampiran 1 WBS:

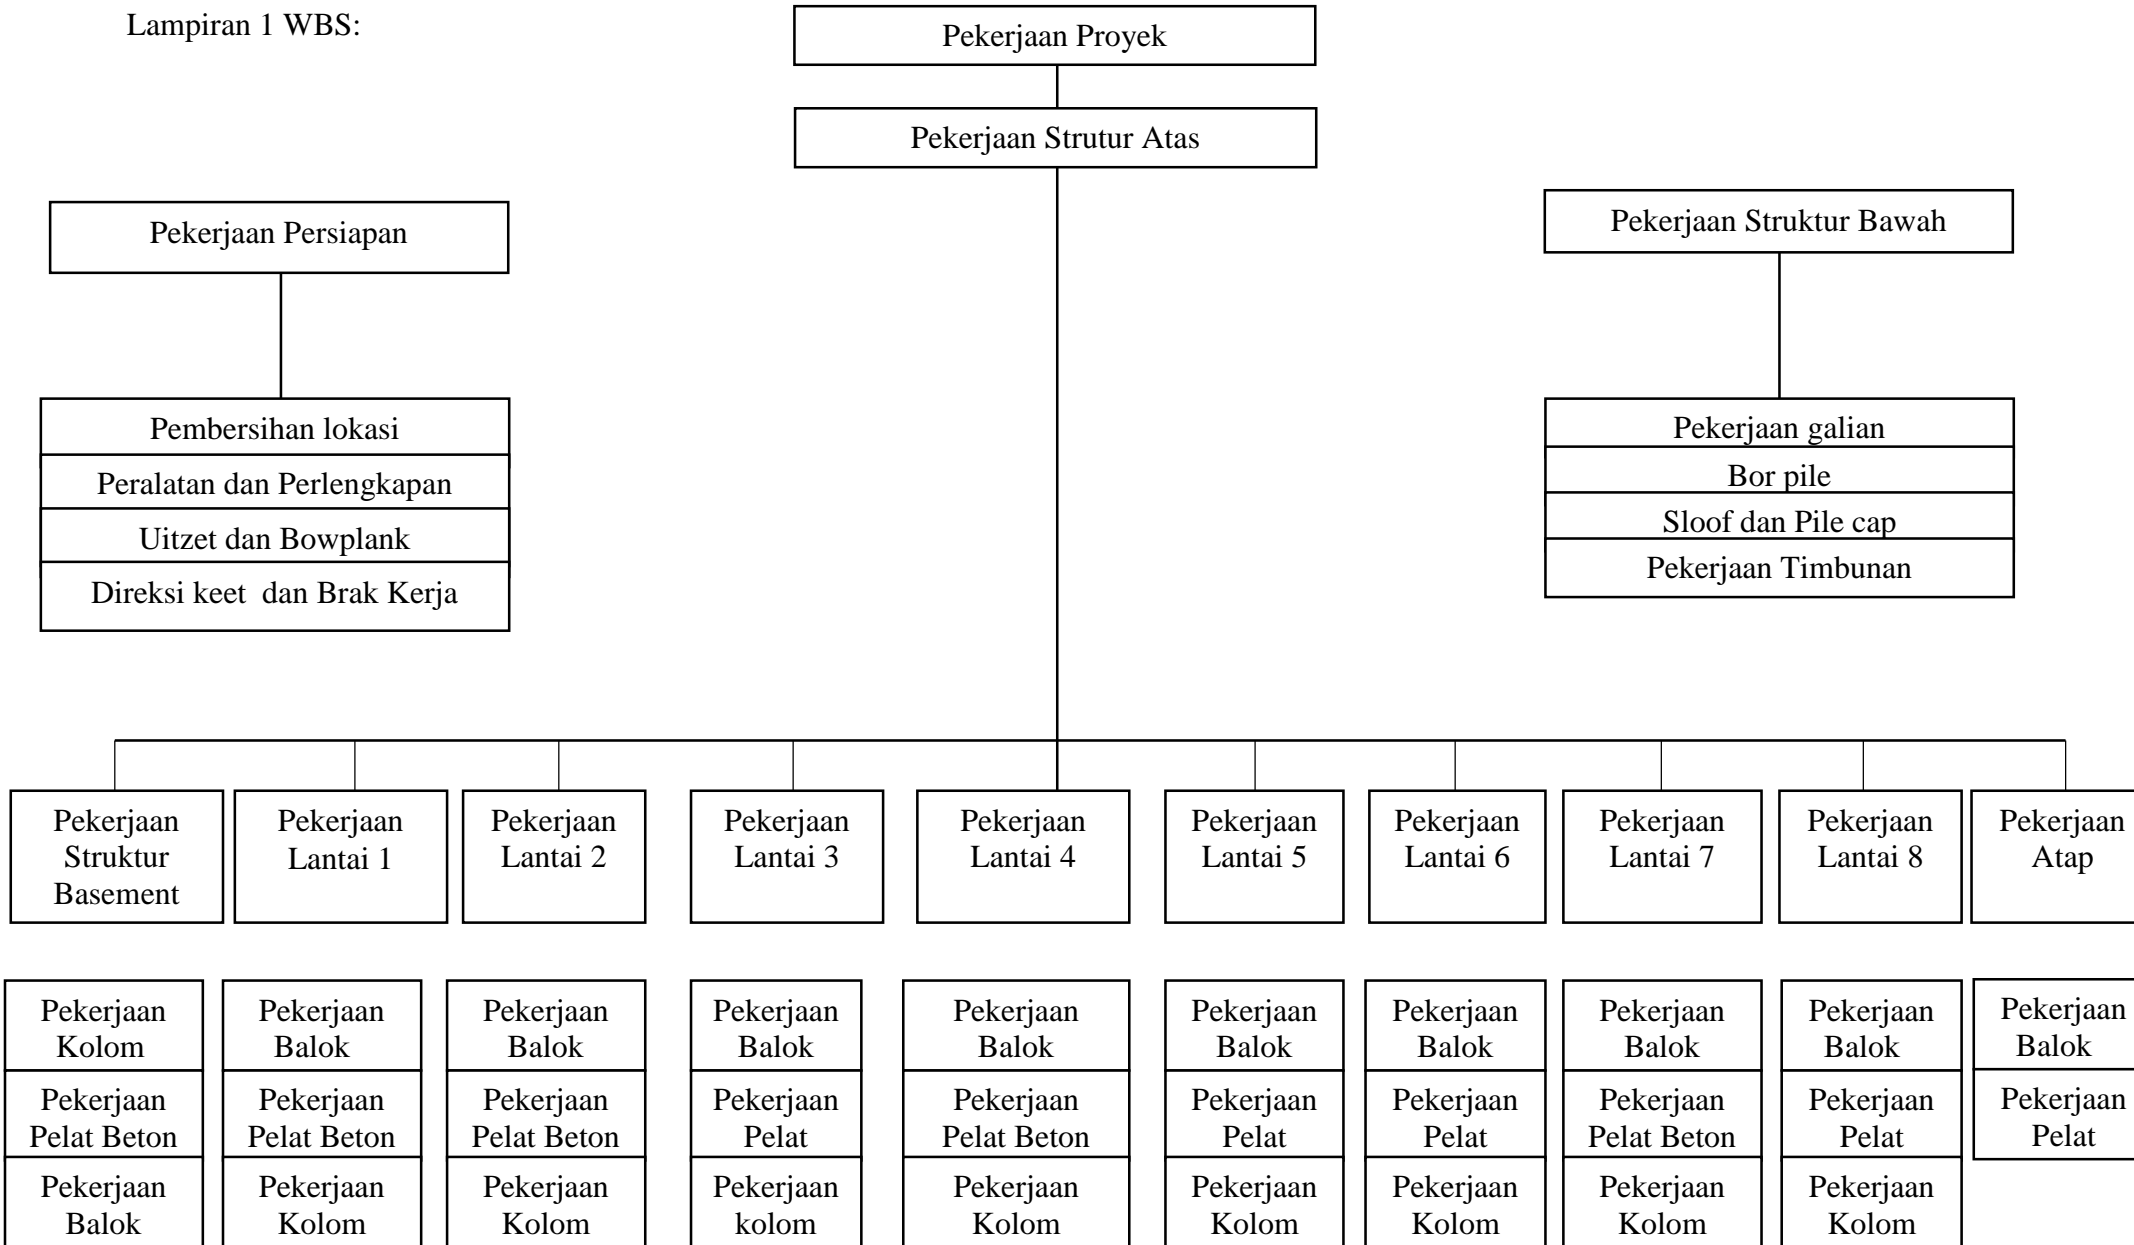

Pekerjaan Persiapan

Pembersihan lokasi

Peralatan dan Perlengkapan

Uitzet dan Bowplank

Direksi keet dan Brak Kerja

Pekerjaan Proyek

Pekerjaan Struktur Atas

Pekerjaan Struktur Bawah

Pekerjaan galian

Bor pile

Sloof dan Pile cap

Pekerjaan Timbunan

Pekerjaan Struktur Basement

Pekerjaan Lantai 1

Pekerjaan Lantai 2

Pekerjaan Lantai 3

Pekerjaan Lantai 4

Pekerjaan Lantai 5

Pekerjaan Lantai 6

Pekerjaan Lantai 7

Pekerjaan Lantai 8

Pekerjaan Atap

Pekerjaan Kolom

Pekerjaan Pelat Beton

Pekerjaan Balok

Pekerjaan Balok

Pekerjaan Pelat Beton

Pekerjaan Kolom

Pekerjaan Balok

Pekerjaan Pelat Beton

Pekerjaan Kolom

Pekerjaan Balok

Pekerjaan Pelat

Pekerjaan kolom

Pekerjaan Balok

Pekerjaan Pelat Beton

Pekerjaan Kolom

Pekerjaan Balok

Pekerjaan Pelat

Pekerjaan Kolom

Pekerjaan Balok

Pekerjaan Pelat

Pekerjaan Kolom

Pekerjaan Balok

Pekerjaan Pelat Beton

Pekerjaan Kolom

Pekerjaan Balok

Pekerjaan Pelat

Pekerjaan Kolom

Pekerjaan Balok

Pekerjaan Pelat

Lampiran 2 Daftar Nama Responden

DAFTAR RESPONDEN KUISIONER

NO	NAMA	JABATAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

**LAMPIRAN 3 FORM
KUISIONER**



NO	ITEM PEKERJAN	IDENTIFIKASI KEJADIAN	SKALA KEMUNGKINAN				DAMPAK	SKALA					
			1	2	3	4		1	2	3	4		
1	Pekerjaan persiapan												
	pembersihan lahan	bagaiman degan permasalahan perizinana					menimbulkan masalah degan lingkungan setempat sehingga proses pekerjaan tertuda						
	perlatan dan perlengkapan kerja	keterbatasan alat					terhambatnya waktu pngerjaan						
	uizet dan bowplank	keterbatasan tenaga kerja					pekerjaan mengalami penambahan durasi						
	direksi dan barak kerja	kondisi lahan					pekerjaan mengalami penambahan durasi						
		komunikasi antara tenaga kerja					terjadi salah paham antara tenaga kerja						
2	Pekerjaan struktur bawah												
	pekerjaan galian	keterbatasan alat					menambah durasi pekerjaan						
	pekerjaan bor pile	faktor cuaca					tertunda waktu pngerjaan						
		terbatas atau kualitas alat kerja					pekerjaan mengalami penambahan durasi						
	pekerjaan sloof dan pile cap	terbatas tenaga kerja					pekerjaan mengalami penambahan durasi						
		faktor cuaca					tertunda waktu pengerjaan						
		keterbatasan bahan material					terhambatnya waktu pngerjaan						
	pekerjaan timbunan	kualitas tenaga kerja yang kurnag					terhambatnya waktu pengerjaan						
		faktor cuaca					tertunda pekerjaan						
3	Pekerjaan struktur basement												
	pekerjaan kolom dan Shearwall	keterbatasan tenaga kerja					terlambatnya waktu pngerjaan						
		kualitas tenaga kerja kurang					terjadi salah paham antara tenaga kerja						
	pekerjaan balok	kualitas tenaga kerja yang kurang					pekerjaan mengalami penambahan durasi						
	pekerjaan pelat basement	keterbatasan bahan material					tertunda waktu pngerjaan						
	pekerjaan tangga	kualitas tenaga kerja yang kurang					pengerjaan mngalami penambahan durasi						

4	pekerjaan pelat lantai 1												
	pekerjaan kolom dan Shearwall	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
		kualitas tenaga kerja yang kurang					pekerjaan di ulangi						
	pekerjaan balok	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
	pekerjaan pelat lantai 1	ketersedian bahan material					pekerjaan tertunda						
		ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
	pekerjaan tangga	kualitas tenaga kerja yang kurang					terjadi pengulangan pekerjaan						
5	pekerjaan pelat lantai 2												
	pekerjaan kolom dan Shearwall	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
		kualitas tenaga kerja yang kurang					pekerjaan di ulangi						
	pekerjaan balok	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
	pekerjaan pelat lantai 2	ketersedian bahan material					pekerjaan tertunda						
		ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
	pekerjaan tangga	kualitas tenaga kerja yang kurang					terjadi pengulangan pekerjaan						
6	pekerjaan struktur lantai 3												
	pekerjaan kolom dan Shearwall	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
		kualitas tenaga kerja yang kurang					pekerjaan di ulangi						
	pekerjaan balok	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
	pekerjaan pelat lantai 3	ketersedian bahan material					pekerjaan tertunda						
		ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
	pekerjaan tangga	kualitas tenaga kerja yang kurang					terjadi pengulangan pekerjaan						


7	pekerjaan struktur lantai 4												
	pekerjaan kolom dan Shearwall	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
		kualitas tenaga kerja yang kurang					pekerjaan di ulangi						
	pekerjaan balok	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
	pekerjaan pelat lantai 4	ketersedian bahan material					pekerjaan tertunda						
		ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
	pekerjaan tangga	kualitas tenaga kerja yang kurang					terjadi pengulangan pekerjaan						
8	pekerjaan struktur lantai 5												
	pekerjaan kolom dan Shearwall	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
		kualitas tenaga kerja yang kurang					pekerjaan di ulangi						
	pekerjaan balok	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
	pekerjaan pelat lantai 5	ketersedian bahan material					pekerjaan tertunda						
		ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
	pekerjaan tangga	kualitas tenaga kerja yang kurang					terjadi pengulangan pekerjaan						
9	pekerjaan struktur lantai 6												
	pekerjaan kolom dan Shearwall	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
		kualitas tenaga kerja yang kurang					pekerjaan di ulangi						
	pekerjaan balok	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
	pekerjaan pelat lantai 6	ketersedian bahan material					pekerjaan tertunda						
		ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan						
	pekerjaan tangga	kualitas tenaga kerja yang kurang					terjadi pengulangan pekerjaan						

10	pekerjaan struktur lantai 7										
	pekerjaan kolom dan Shearwall	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan				
		kualitas tenaga kerja yang kurang					pekerjaan di ulangi				
	pekerjaan balok	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan				
	pekerjaan pelat lantai 7	ketersedian bahan material					pekerjaan tertunda				
		ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan				
	pekerjaan tangga	kualitas tenaga kerja yang kurang					terjadi pengulangan pekerjaan				
11	pekerjaan struktur lantai 8										
	pekerjaan kolom dan Shearwall	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan				
		kualitas tenaga kerja yang kurang					pekerjaan di ulangi				
	pekerjaan balok	ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan				
	pekerjaan pelat lantai 3	ketersedian bahan material					pekerjaan tertunda				
		ketersedian tenaga kerja					penambahan durasi pekerjaan				
	pekerjaan tangga	kualitas tenaga kerja yang kurang					terjadi pengulangan pekerjaan				


LAMPIRAN 4 GRAFIK HASIL

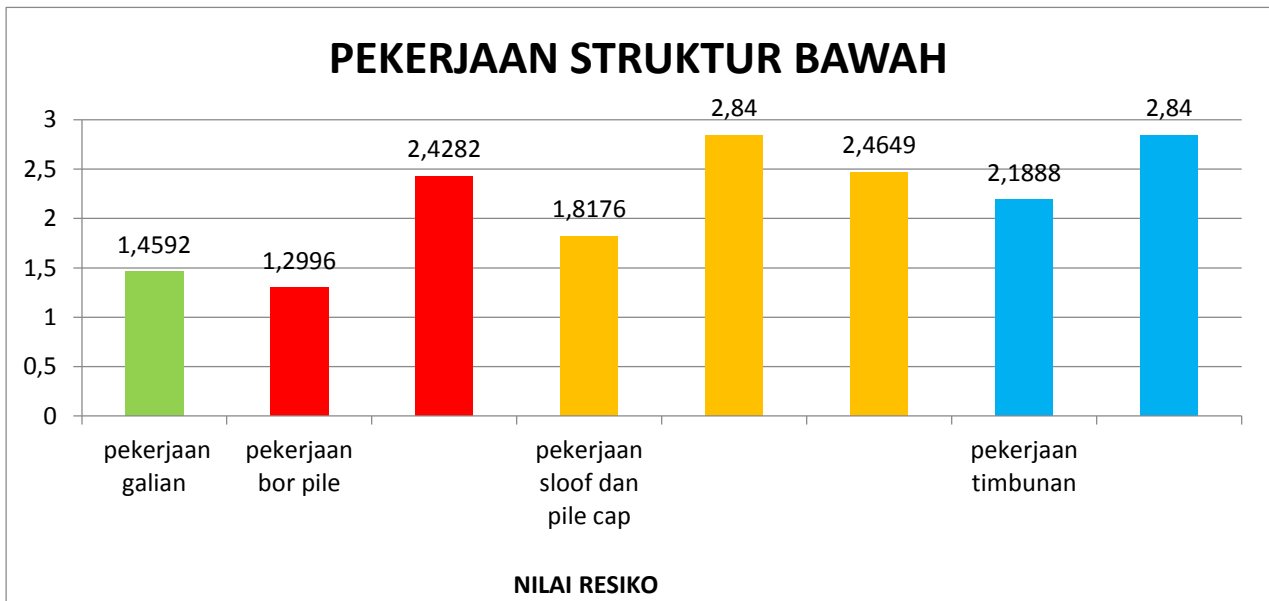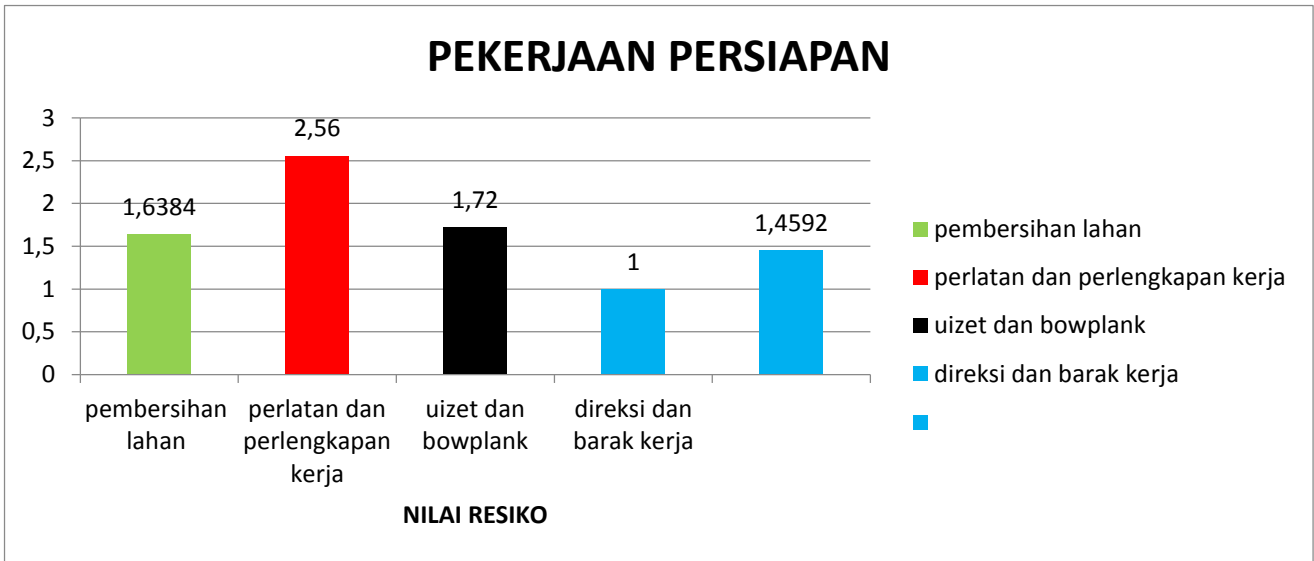


PEKERJAAN STRUKTUR BASEMENT

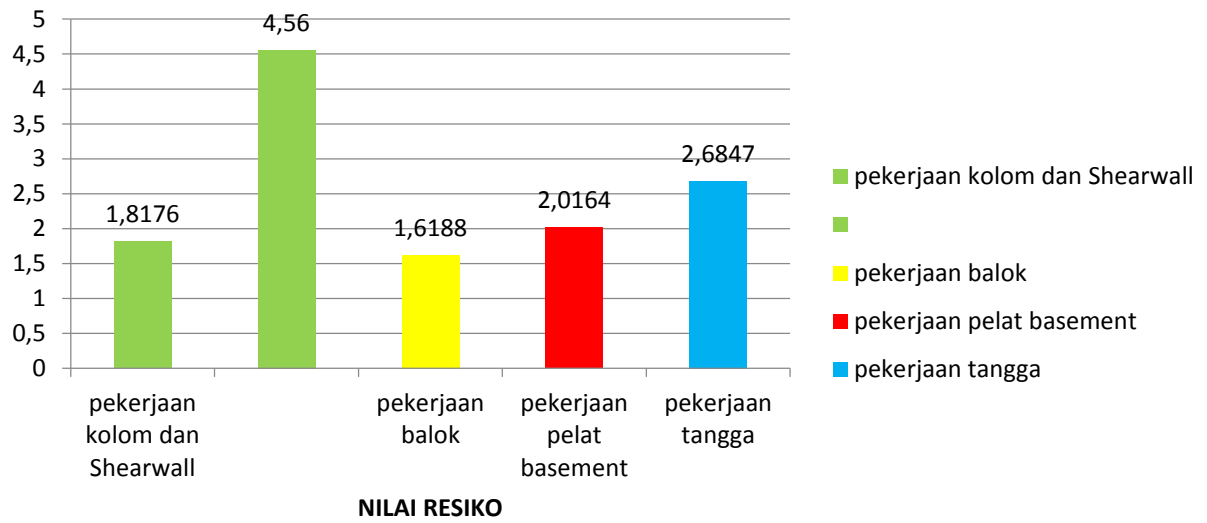


PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

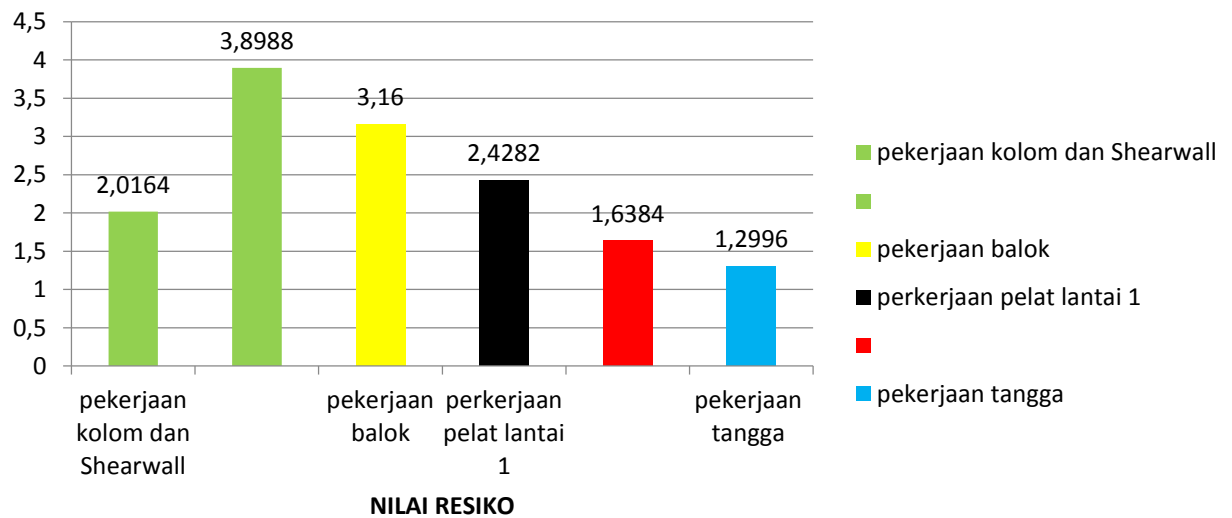


PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2

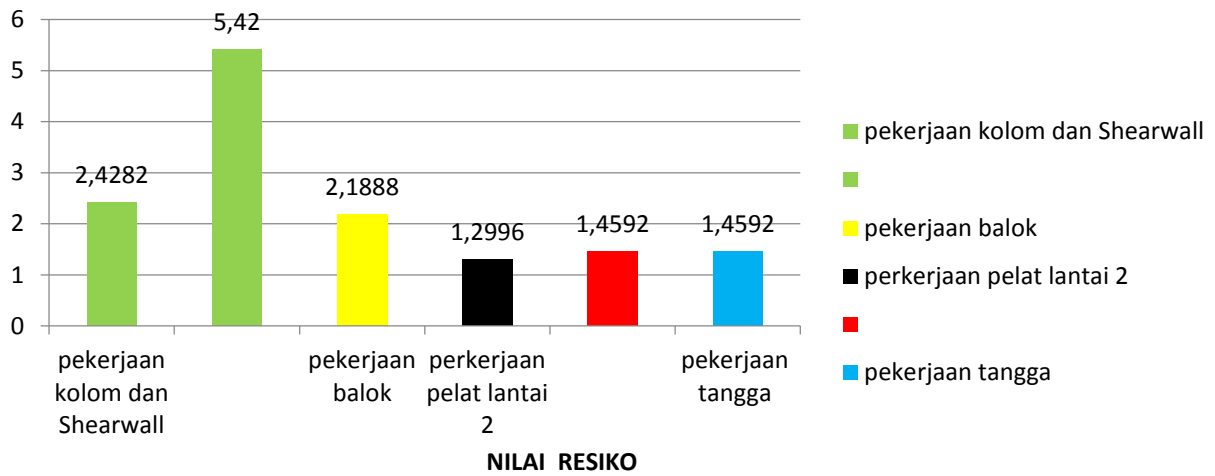


PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3

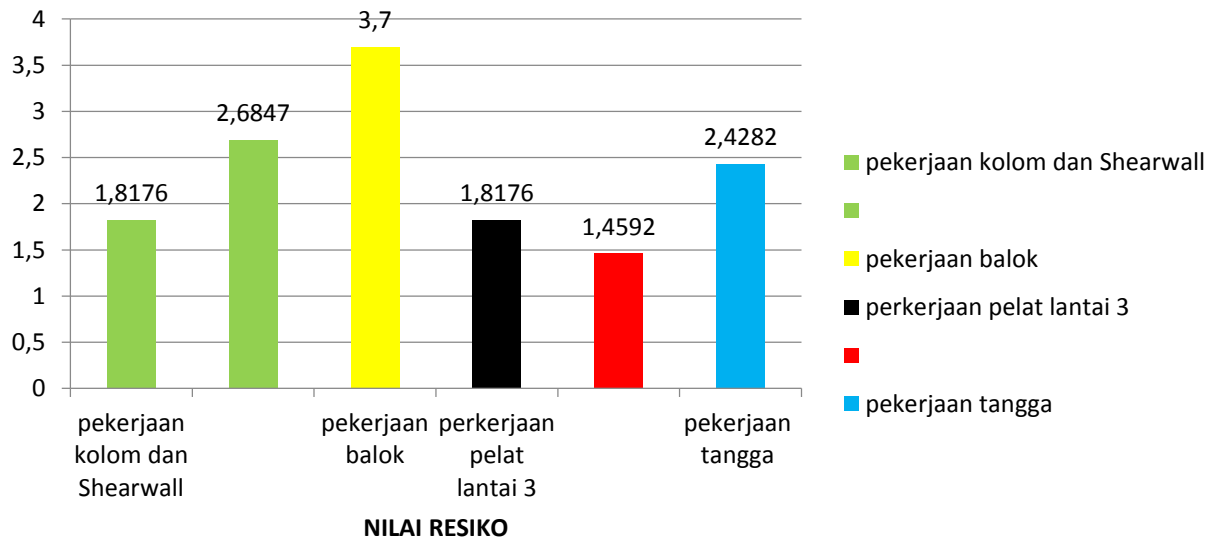


PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4

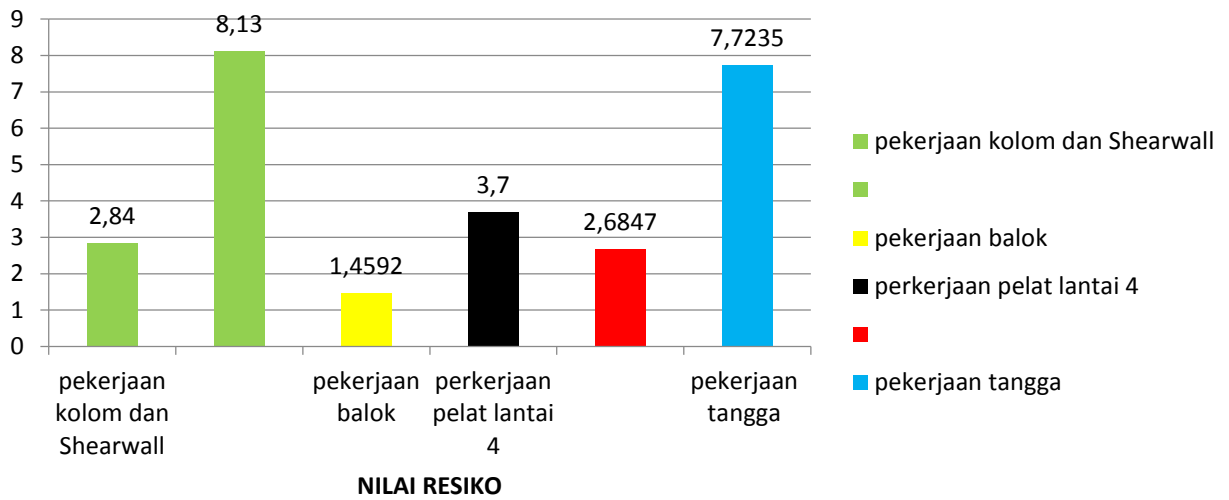


PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 5

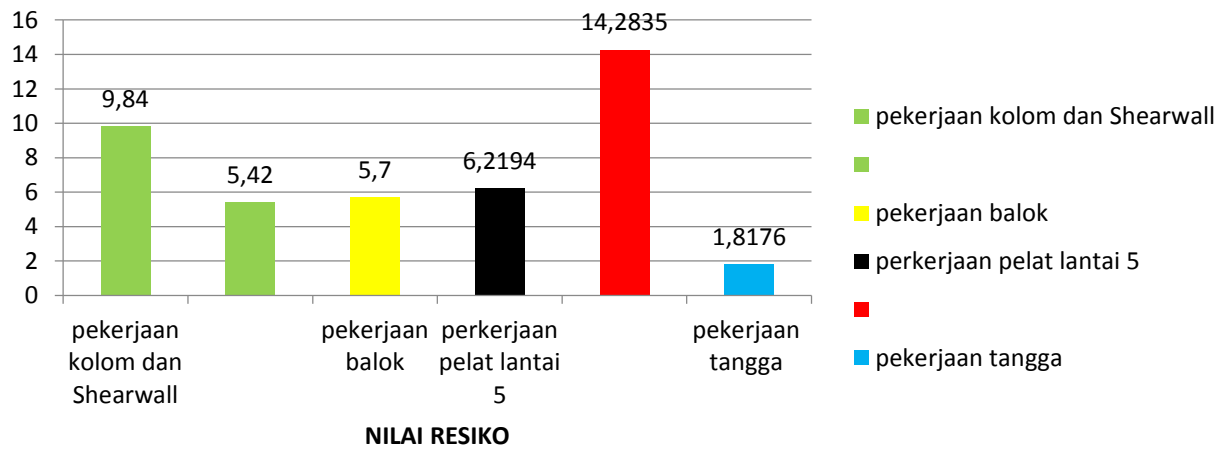


PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 6

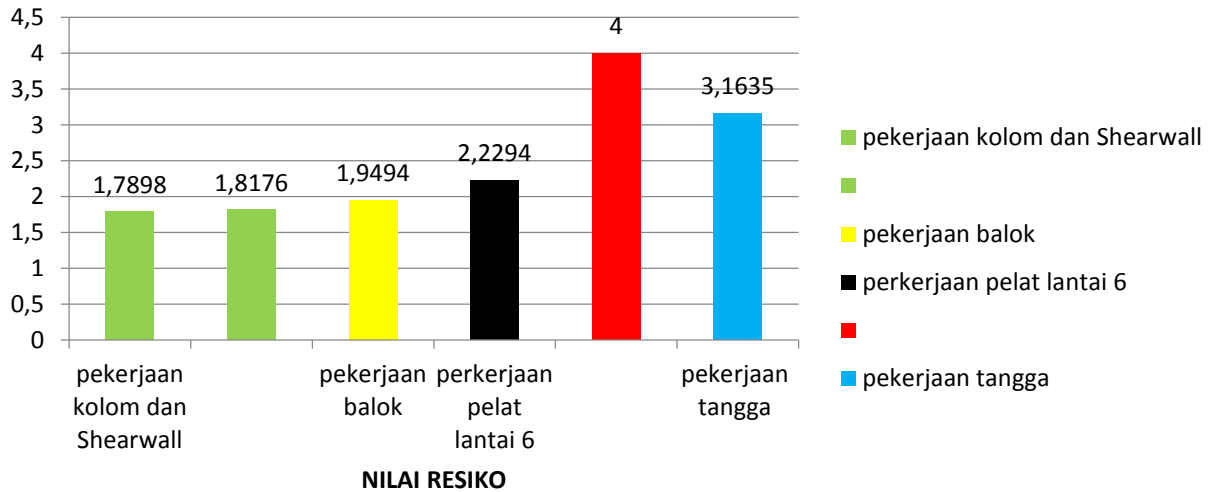


PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 7

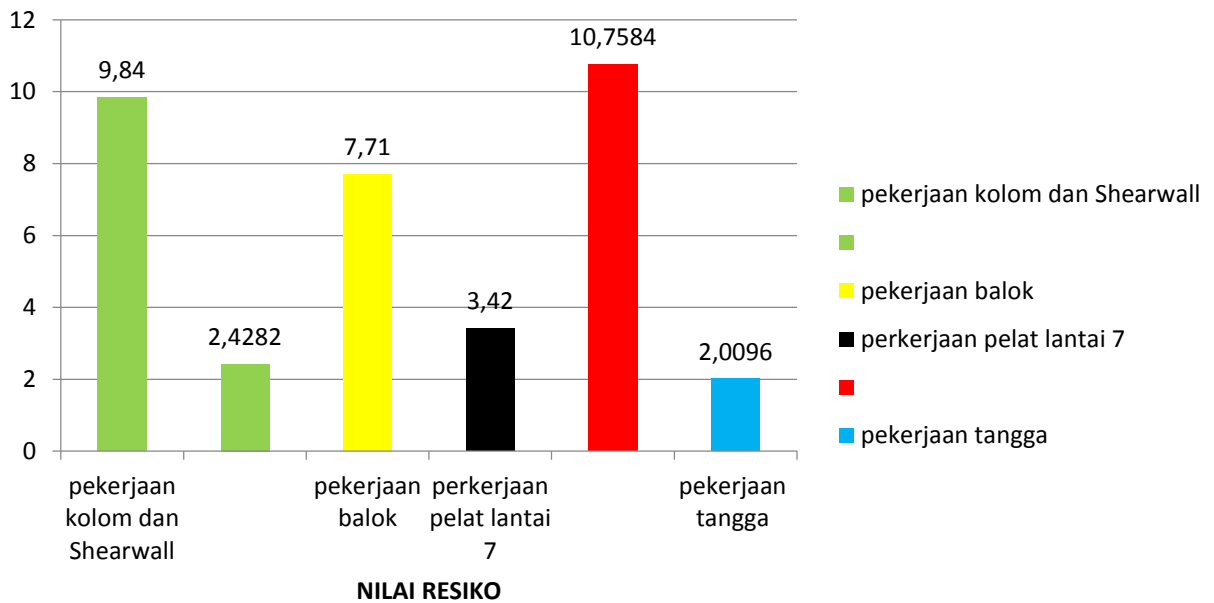

PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 8

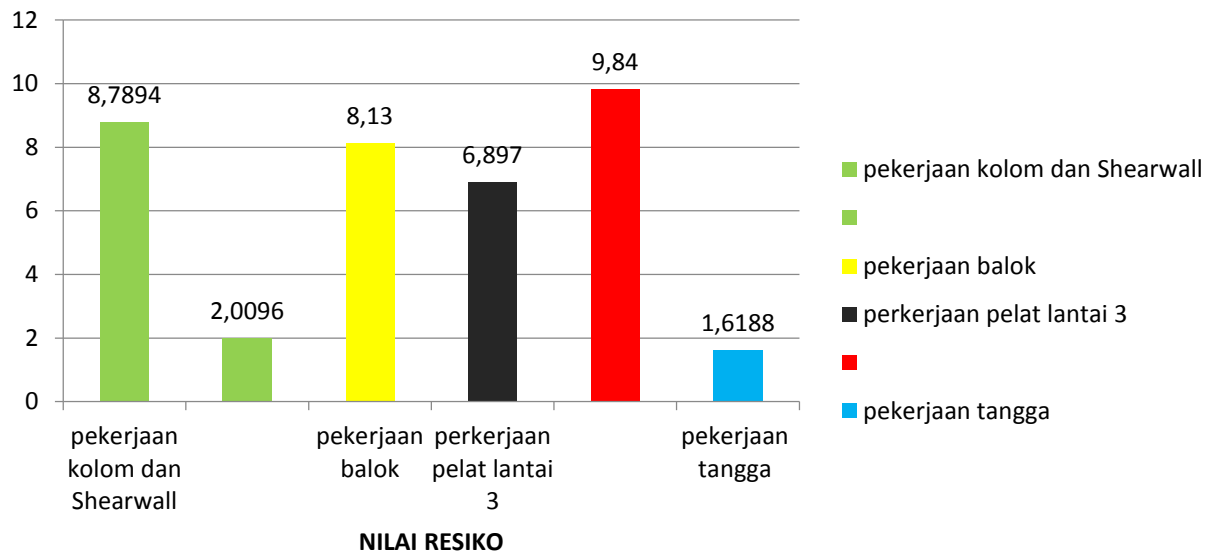

Pekerjaan Struktur Atas

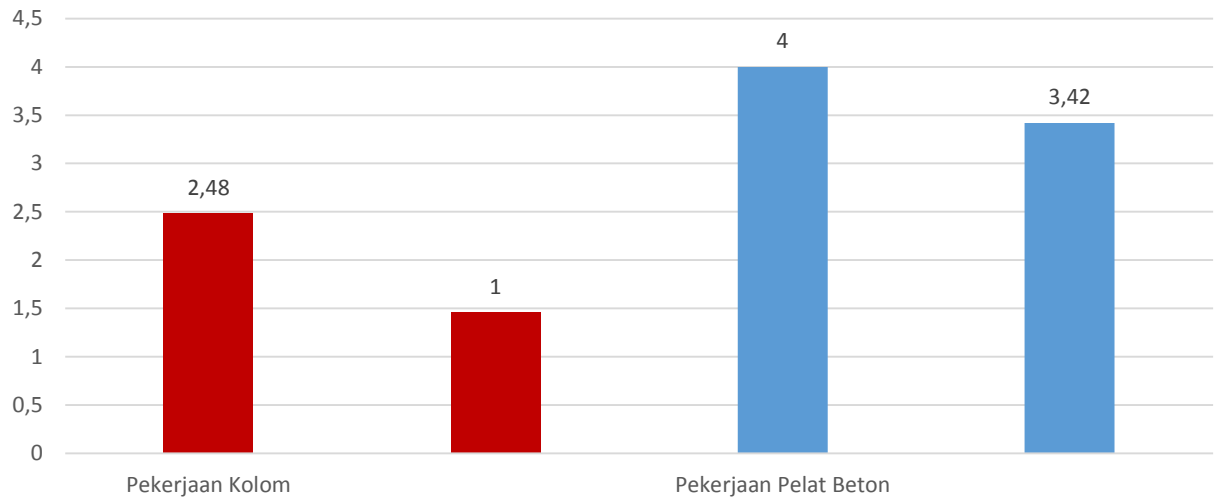

ANALISIS SECARA MENYELURUH

